

岩沼市震災復興計画マスタープラン フォローアップ計画 事業進捗状況一覧

令和2年度末現在（計画期間満了時点）

重点取組事項 (注)	事業 番号	事業名	計画 進捗	事業進捗		完了 (予定) 年度
				全体	うち着手済	
① 被災者の生活 支援と住環境 の整備 (P1)	1	被災者 支援事業	C	・集団移転地での被災者の健康維持や心の ケア対策、住民主体のサロン等でのコミュニ ティづくりと生きがいをもって生活できる よう側面からのサポートを行う。 ・災害援護資金貸付金の償還業務、被災者 への再建のための相談や支援。	・サポートセンターの設置・運営（H23～R2） ・コミュニティ支援員による巡回個別訪問、 見守り活動、集団移転地の自治会運営支 援（R3～R5） ・災害援護資金貸付件数：139件	R5 (以降未定)
② 減災を基本とした 安全・安心なまち づくり (P1～P4)	4	避難路 確保事業	A	寺島海岸線 L=1199m 藤曽根線 L=546m 本町早股線 L=2220m 藤曽根線延伸部 L=1324m	寺島海岸線 L=1199m 藤曽根線 L=546m 本町早股線 L=2220m 藤曽根線延伸部 L=1324m	H30
	5	排水対策事業	A	新設排水ポンプ場 3箇所 新設幹線排水路 5.8km	新設排水ポンプ場 3箇所 新設幹線排水路 5.8km	H31
	6	「千年希望の丘」 整備事業	A	千年希望の丘6公園（相野釜、藤曽根、長 谷釜、二野倉、新浜、蒲崎）の避難丘と園 路を整備する。なお、当初15基を計画した 丘の整備は14基で完了。	千年希望の丘6公園（相野釜、藤曽根、長 谷釜、二野倉、新浜、蒲崎）及び14基の 丘と園路（一部を除く）を整備済み。	H31
	7	公共施設 再構築事業	A	東児童館再建（446㎡） 東部地区子育て拠点整備（東保育所再建 及び子育て支援センター新設（保育所定員 90名、延床面積1,310.91㎡）） (仮)防災コミュニティセンター建設(821㎡)	東児童館再建（H26.6開館） 東部地区子育て拠点 （東保育所及び子育て支援センター/H31.4開 所） 玉浦コミュニティセンター完成（H29.5開 館）	H30
	8	防災意識 啓発事業	A	・地域防災計画の改定を踏まえ、自助・共 助の意識啓発の方策を講じる。 ・津波情報提供設備や避難誘導標識の設 置を図る。 ・津波を想定した避難訓練の充実に取り組む	・津波避難のあり方懇談会を通して、安全な 避難のルール作りの方向付けを行う(津波 避難訓練4回実施) ・自主防災組織への災害備品の助成 ・防災行政無線屋外拡声子局の整備充実 ・防災ラジオの配布・津波避難誘導標識の 設置 ・防災士の養成	H30 (一般施策へ移行、 継続)
9	防災教育事業 (学校)	A	各小中学校における防災マニュアルの作成・ 実践・検討	市内小・中学校8校	R2 (一般施策へ移行、 継続)	
③ 産業の復興と 新産業の創出 (P4～P5)	1	農地復旧事業	A	農地復旧 845ha	農地復旧 845ha	H30
	3	農業生産低コスト 化事業	B	ほ場整備事業 東部地区630ha、 西部地区188ha、北部地区98ha	ほ場整備事業 東部地区630ha、 西部地区188ha、北部地区98ha (県営の圃場整備事業の保管工事、換地 業務については令和4年度まで継続予定)	R4
	8	企業誘致事業	B	矢野目西地区 事業面積17.7ha 分譲区画数：8（13.1ha） (西区域：5、東区域：3)	分譲済：西区域5区画（10.7ha）	R4
④ 震災の伝承と歴 史的景観の保全 (P6)	1	震災伝承事業	C	・千年希望の丘交流センターの整備 ・震災記録誌の作成 ・震災伝承・防災学習プログラム等	・千年希望の丘交流センター（H28.4開 所） ・『東日本大震災 岩沼市の記録』（R2.3 発行） ・記録映像「コミュニティの力を信じた復興 ～トプランナーと呼ばれた岩沼市～」 (R3.3制作)	(継続)
新たな取組 (P7～P8)	1	移転元地 利活用事業	B	・移転元地利活用方針の策定 ・移転元地の利活用	・移転元地利活用方針の策定（H30.6） ・移転元地の利活用（8割）	R4
	2	被災道路 補修事業	A	市道13路線 総延長 L=5908m	市道13路線 総延長 L=5908m	R2
	3	被災者 支援事業 (災害公営住宅 家賃関係)	C	整備戸数：210戸 ①災害公営住宅家賃低廉化事業 管理開始より20年間（H27～R16） ②東日本大震災特別家賃低減事業 管理開始より10年間（H27～R6） ③東日本大震災特別家賃低減事業による 低所得者の家賃一定減免を5年間延長 (R2～R6、以降未定) ④管理開始から10年間、収入超過者の近 傍同種家賃への傾斜家賃割増分を減免 (R2～R6、以降未定)	①H27～R3 ②H27～R3 ③R2～R3 ④R2～R3	①R16 ②R6 ③R6 (以降未定) ④R6 (以降未定)
	4	復興五輪関連事 業	B	・復興ありがとうホストタウン事業 ・東京2020大会気運醸成事業 ・聖火リレー関連事業	東京2020大会が1年延期となったことに 伴い、当市における事業の終期も令和3 年度に延びた。(R3.6聖火リレー、R3.7～ 8オリンピック、R3.8～9パラリンピック 大会)	R3

(注)「①～④」は、マスタープラン(改訂版・H23～H29)からの継続事項、「新たな取組」は、新たにフォローアップ計画(H39～H32)に位置付けられた事項を指します。


【進捗状況集計】 震災復興計画マスタープラン(改訂版) フォローアップ計画 1.5 事業

- うち
- A 計画期間内（令和2年度まで）に完了・・・8 事業
 - B 事業完了時期が令和3年度以降 …… 4 事業
 - C その他（期間の定めのない、未定等） …… 3 事業

◆ マスタープラン(改訂版)からの継続事業(11事業)


① 被災者の生活支援と住環境の整備

事業名		事業目標期間	事業主体	進捗状況(R2年度末現在)								
① - 1 被災者支援事業		H23~R2	国・県・市	C(その他)								
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> ・集団移転地において、被災者の健康保持や心のケア対策等に取り組みます。 ・住民主体のサロン等によるコミュニティづくりと生きがいをもって生活できるよう、側面からのサポートを行います。 ・災害援護資金貸付金の償還業務や被災された方々への再建のための相談や支援を行います。 <p>【継続事業】</p>											
事業規模	全 体	復興庁被災者支援総合交付金事業	うち 着手済	サポートセンターの設置・運営(H23~R2) コミュニティ支援員による巡回個別訪問、見守り活動、集団移転地の自治会運営支援(R3~R5) 災害援護資金貸付件数:139件	完了 年度	R5予定 (以降未定)						
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	2,024,242	5,030	145,660	419,770	541,355	471,642	143,037	90,107	128,470	37,546	41,625	R3予算額 10,000

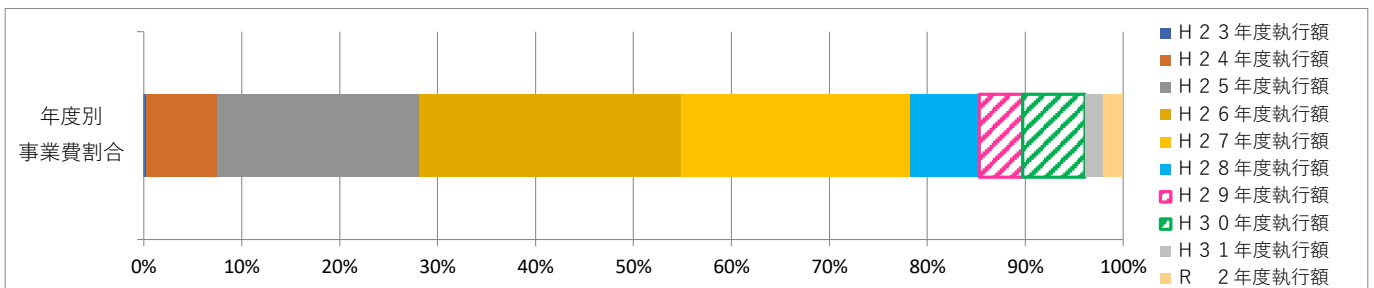


② 減災を基本とした安全・安心なまちづくり


事業名		事業目標期間	事業主体	進捗状況(R2年度末現在)								
② - 4 避難路確保事業		H23~H30	市	A(完了)								
事業概要	東部地区の避難路を確保するため、津波避難のあり方懇談会や避難訓練などの経緯を踏まえ、現在整備を進めている市道寺島海岸線の早期完成に取り組みます。											
事業規模	全 体	寺島海岸線 L=1199m 藤管根線 L=546m 本町早股線 L=2220m 藤管根線延伸部 L=1324m	うち 着手済	寺島海岸線 L=1199m 藤管根線 L=546m 本町早股線 L=2220m 藤管根線延伸部 L=1324m	完了 年度	H30						
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	3,398,240	0	27,000	140,240	658,770	938,580	859,910	636,580	137,160			

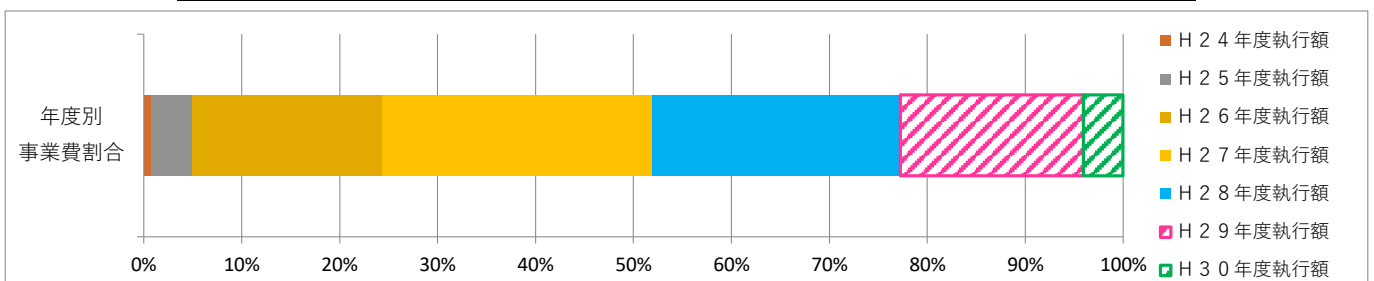


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)						
② - 5 排水対策事業		H24~H31		国・県・市		A(完了)						
事業概要	地盤沈下や排水機場の機能喪失等に伴う浸水リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を進めるため、新たな幹線排水路及び排水機場の整備に取り組みます。											
事業規模	全 体	新設排水ポンプ場 3箇所 新設幹線排水路 5.8km			うち 着手済	新設排水ポンプ場 3箇所 新設幹線排水路 5.8km		完了 年度	H31			
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	23,771,426	0	185,560	3,102,300	7,159,967	5,942,223	3,729,050	1,729,202	424,674	1,498,450		

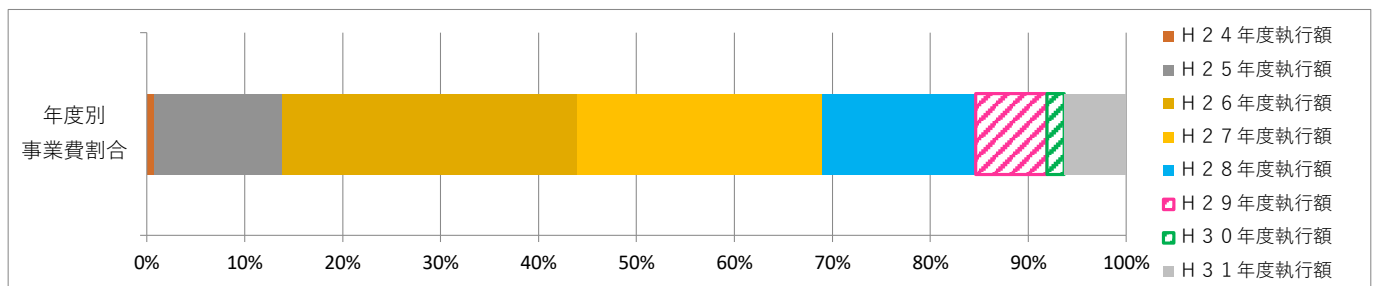


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)						
② - 6 「千年希望の丘」整備事業		H23~H31		市		A(完了)						
事業概要	防災機能を有する都市公園「千年希望の丘」の整備に取り組みます。未整備であった丘1基の必要性等を検討するとともに、未整備区間の園路整備を行うことにより、千年希望の丘の整備事業を完了します。											
事業規模	全 体	千年希望の丘6公園(相野釜、藤曽根、長谷釜、二野倉、新浜、蒲崎)の避難丘と園路を整備する。なお、当初15基を計画した丘の整備は14基で完了。			うち 着手済	千年希望の丘6公園(相野釜、藤曽根、長谷釜、二野倉、新浜、蒲崎)及び14基の丘と園路(一部を除く)を整備済み。		完了 年度	H31			
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	4,304,060	0	182,050	443,000	1,390,570	1,062,410	1,021,130	128,400	68,700	7,800		

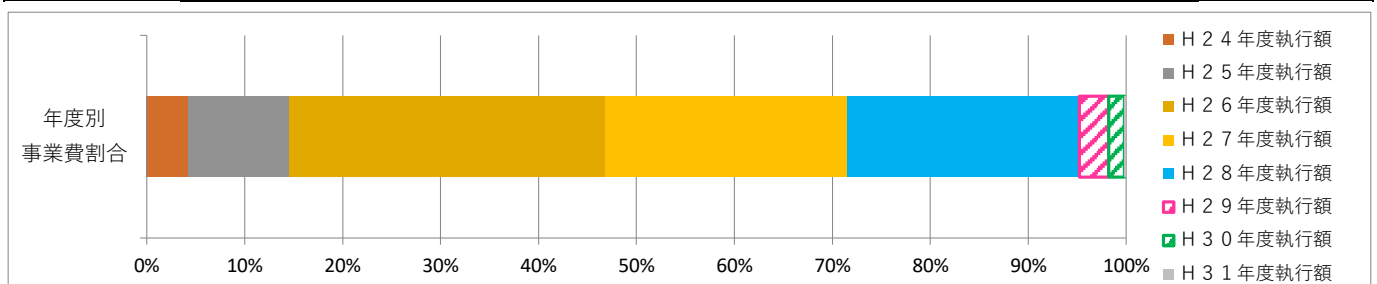


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
② - 7 公共施設再構築事業		H24~H30		県・市		A(完了)							
事業概要		浸水被害を受けた東保育所について、施設を再建するとともに、子育て支援機能を追加した複合施設として再構築を図ります。また、地域コミュニティの再構築、地区全体の新たな防災コミュニティ形成、地域住民のいきがづくりなどの拠点となる施設の整備に取り組みます。											
事業規模		全 体	東児童館再建(446㎡) 東部地区子育て拠点整備(東保育所再 建及び子育て支援センター新設(保育所 定員90名、延床面積1,310.91㎡)) (仮)防災コミュニティセンター建設(821㎡)	う ち 着 手 済	東児童館再建(H26.6開館) 東部地区子育て拠点(東保育所及び子育て支援セ ンター/H31.4開所) 玉浦コミュニティセンター完成(H29.5開館)	完 了 年 度	H30						
事業費 (千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		1,652,950	0	25,970	307,640	46,640	52,270	400,500	119,930	700,000			

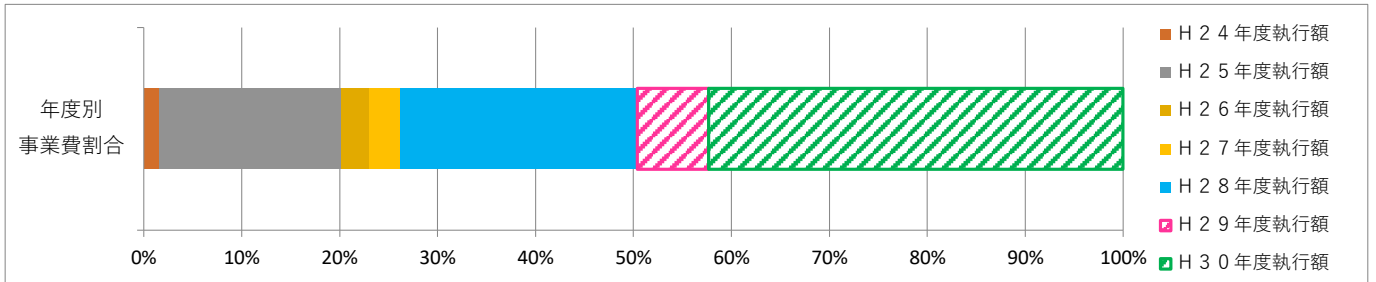

事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
② - 8 防災意識啓発事業		H23~R2		市		A(完了)							
事業概要		市民一人ひとりが災害に的確に対応できるよう、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、災害情報伝達体制の整備充実や避難誘導標識の設置等を行います。また、復興事業の内容を踏まえ地域防災計画を改定し、地域防災力の向上に取り組みます。 【R3~ 一般施策へ移行し、継続】											
事業規模		全 体	・地域防災計画の改定を踏まえ、自助・共助の意識啓発の方策を講じる。 ・津波情報提供設備や避難誘導標識の設置を図る。 ・津波を想定した避難訓練の充実に取り組む	う ち 着 手 済	・津波避難のあり方懇談会を通して、安全な避難のルール作りの方向付けを行う(津波避難訓練4回実施) ・自主防災組織への災害備品の助成 ・防災行政無線屋外拡声子局の整備充実 ・防災ラジオの配布 ・津波避難誘導標識の設置 ・防災士の養成	完 了 年 度	R2						
事業費 (千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		125,430	0	0	0	9,220	10,150	32,680	51,840	15,470	1,500	4,570	

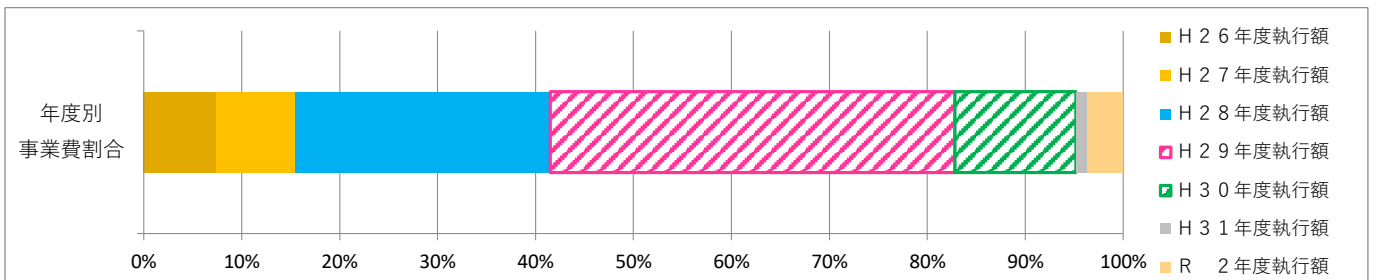


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
② - 9 防災教育事業(学校)		H23~R2		市		A(完了)							
事業概要		各小中学校において作成した防災マニュアルについて、毎年度点検を行い、安全・安心な学校づくりを進めます。 【R3~ 一般施策へ移行し、継続】											
事業規模		全 体	各小中学校における防災マニュアルの作成・実践・検討		う ち 着 手 済	市内小・中学校8校		完 了 年 度	R2				
事業費(千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		1,580	0	1,490	90	0	0	0	0	0	0	0	

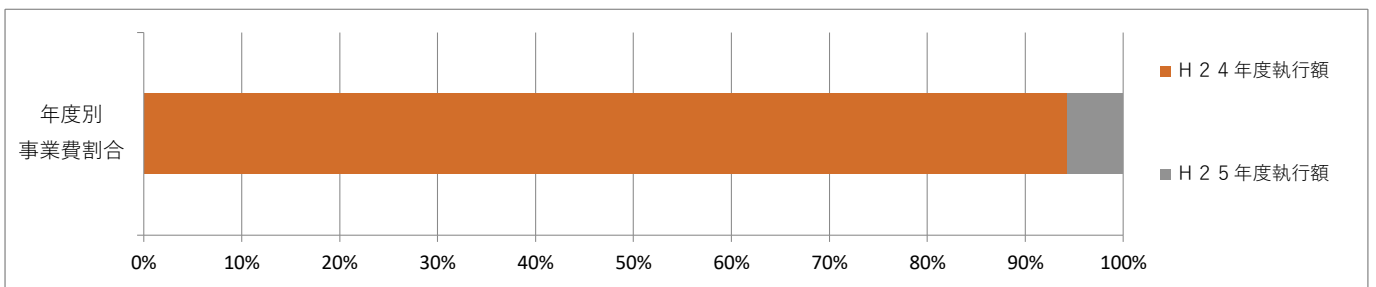


③ 産業の復興と新産業の創出


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
③ - 1 農地復旧事業		H23~H30		国・県・市		A(完了)							
事業概要		震災により著しく損なわれた農業生産力の回復・機能向上を図るため、関係機関と連携して農地の復旧に取り組みます。											
事業規模		全 体	農地復旧 845ha		う ち 着 手 済	845ha		完 了 年 度	H30				
事業費(千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		268,860	48,770	7,280	6,130	7,980	58,350	101,130	38,470	750			

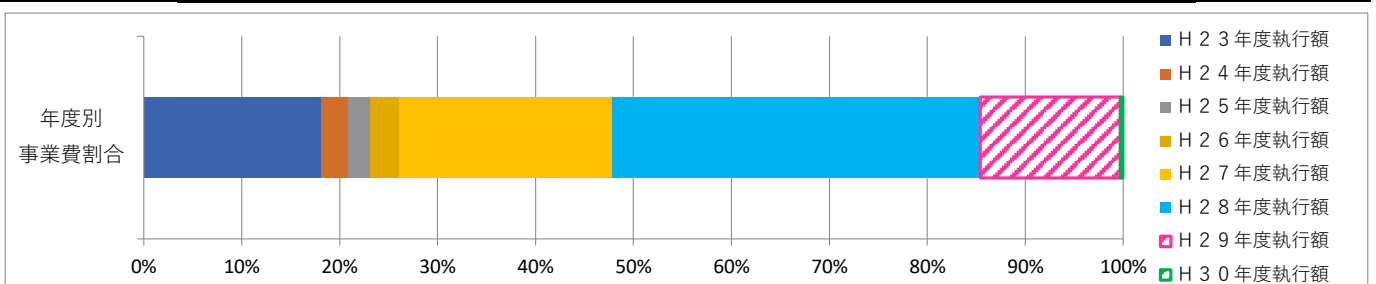

事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
③ - 3 農業生産低コスト化事業		H23～R2		県・市		B(期間延長)							
事業概要		効率的で低コストな農業経営を実現するため、農地の面的集約や経営の大規模化、ほ場の大区画化、集落営農等の取り組みを進めます。 【継続事業】											
事業規模		全 体	ほ場整備事業 東部地区630ha、 西部地区188ha、北部地区98ha			う ち 着 手 済	ほ場整備事業 東部地区630ha、 西部地区188ha、北部地区98ha (県営の圃場整備事業の保管工事、換地業務につ いては令和4年度まで継続予定)		完 了 年 度	R4 予定			
事業費 (千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		4,815,760	140,210	165,960	2,021,900	1,204,820	191,130	408,100	260,220	296,480	116,980	9,960	

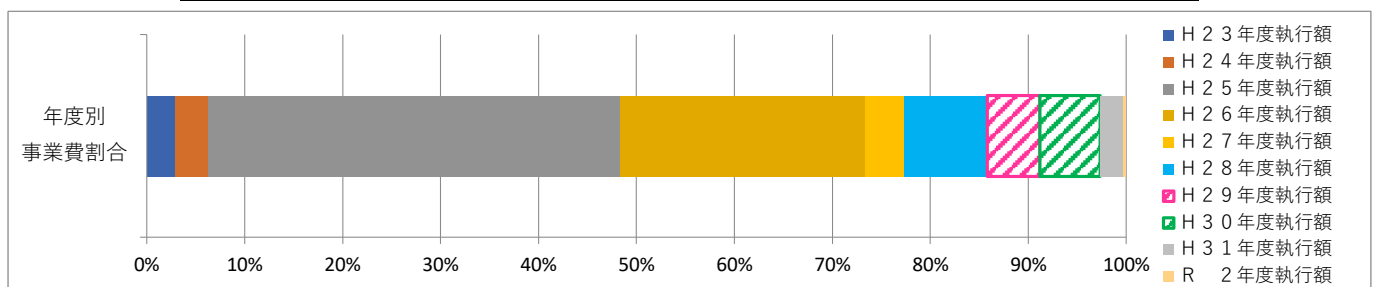


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
③ - 9 企業誘致事業		H23～R2		県・市		B(期間延長)							
事業概要		被災地における雇用機会の確保を図るため、矢野目西地区における物流拠点等を整備し、企業誘致に取り組みます。 【継続事業】											
事業規模		全 体	事業面積17.7ha 分譲区画数:8(13.1ha) (西区域:5、東区域:3)			う ち 着 手 済	分譲済:西区域5区画(10.7ha)		完 了 年 度	R4 予定			
事業費 (千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		3,330,920	25,710	105,300	85,750	13,160	0	58,210	747,790	2,295,000	0	0	R3 予算額 7,182

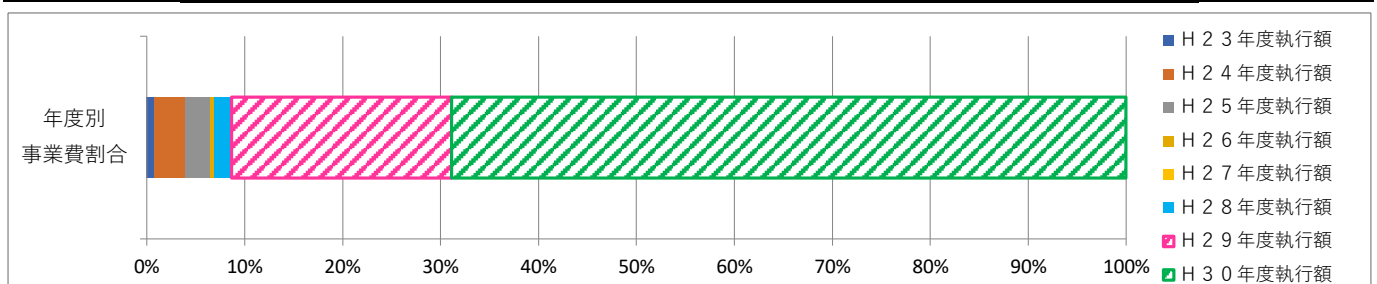


④震災の伝承と歴史的景観の保全

事業名		事業目標期間	事業主体	進捗状況(R2年度末現在)								
④ - 1 震災伝承事業		H23～R2	国・県・市	C(その他)								
事業概要	震災の風化を防止し、震災の記憶や教訓を後世に伝承するため、千年希望の丘における防災教育や震災語り部の育成及び記録誌の作成等に取り組みます。 【継続事業】											
事業規模	全体 千年希望の丘交流センターの整備 震災記録誌の作成 震災伝承・防災学習プログラム等	うち着手済 千年希望の丘交流センター(H28.4開所) 『東日本大震災 岩沼市の記録』(R2.3発刊) 記録映像「コミュニティの力を信じた復興～トプランナーと呼ばれた岩沼市～」(R3.3制作)	完了年度	—								
事業費(千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	113,739	0	0	0	1,000	73,133	5,900	2,000	5,140	22,506	4,060	R3予算額622

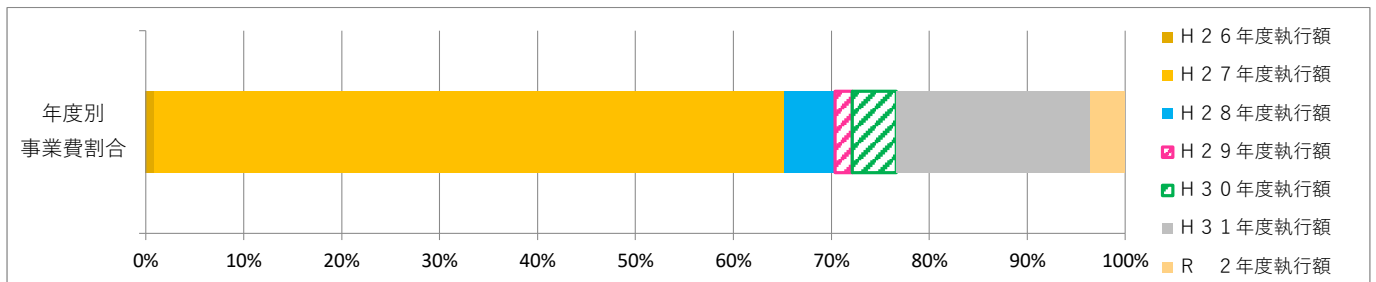


◆ 新たな取組（4事業）


事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)						
1 移転元地活用事業		H29～R2		市		B(期間延長)						
事業概要	防災集団移転の実施に伴い、被災者より買い上げた移転元地の活用を図るため、その内容や手法について方針を策定し、その実現に向け取り組みます。											
事業規模	全 体	・移転元地活用方針の策定 ・移転元地の利活用			う ち 着 手 済	・移転元地活用方針の策定(H30.6) ・移転元地の利活用(8割)		完 了 年 度	R4 予定			
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	1,512,000	0	0	0	0	0	0	1,512,000	0	0	0	

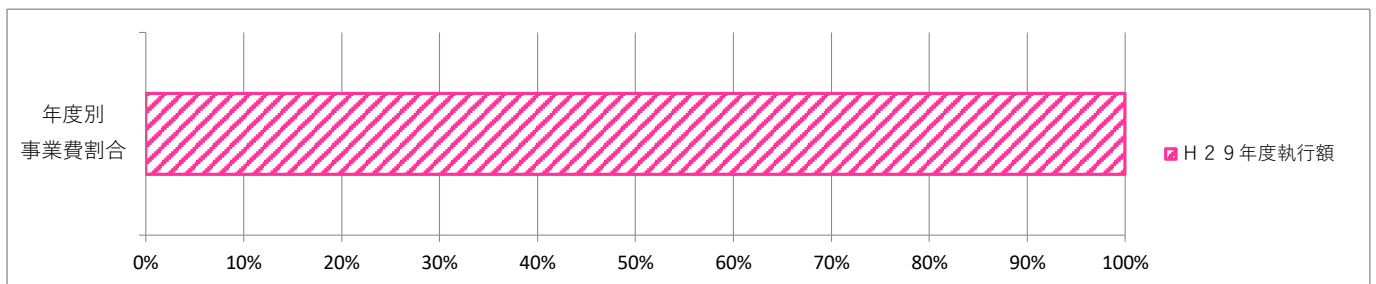

事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)						
2 被災道路補修事業		H30～R2		市		A(完了)						
事業概要	復旧・復興事業による大型車両の通行に伴い、破損した道路の補修に取り組みます。											
事業規模	全 体	市道13路線 総延長 L=5908m			う ち 着 手 済	市道13路線 総延長 L=5908m		完 了 年 度	R2			
事業費 (千円)	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
	371,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,273	R2完了

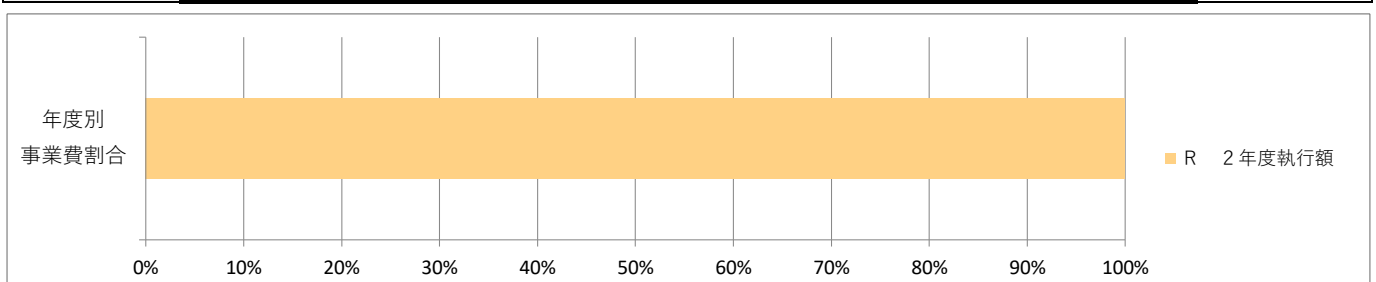

事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
3 被災者支援事業(災害公営住宅家賃関係)		H27~R2		市		C(その他)							
事業概要		災害公営住宅に入居した被災者に対する家賃減免等について検討し、必要な対応を行います。 【継続事業】											
事業規模		全体	整備戸数210戸 ①災害公営住宅家賃低廉化事業/管理開始より20年間(H27~R16) ②東日本大震災特別家賃低減事業/管理開始より10年間(H27~R6) ③東日本大震災特別家賃低減事業による低所得者の家賃一定減免を5年間延長(R2~R6、以降未定) ④管理開始から10年間、収入超過者の近傍同種家賃への傾斜家賃割増分を減免(R2~R6、以降未定)	うち着手済	①H27~R3 ②H27~R3 ③R2~R3 ④R2~R3	完了年度	①R16 ②R6 ③R6(以降未定) ④R6(以降未定)						
事業費※(千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		6,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,412	

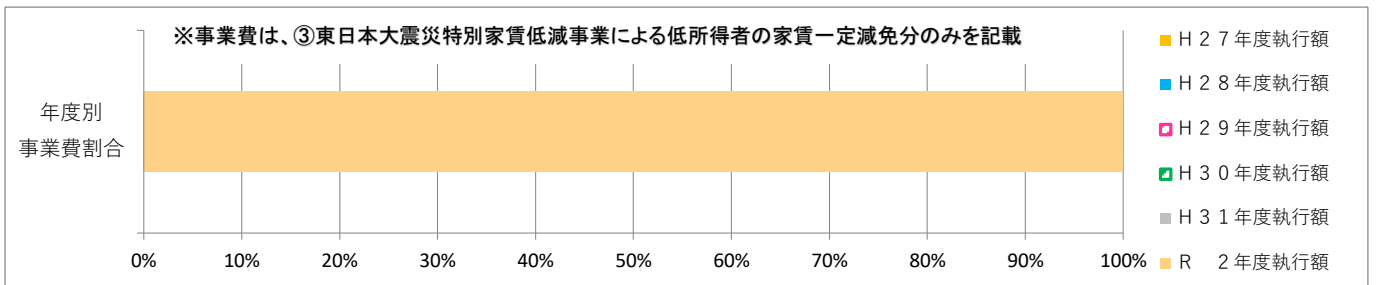

事業名		事業目標期間		事業主体		進捗状況(R2年度末現在)							
4 復興五輪関連事業		H30~R2		市		B(期間延長)							
事業概要		復興五輪に関連する取り組みを通じ、国内外からの復興支援に対する感謝の意を示すとともに、復興状況を発信することによる震災の風化防止を図ります。 【R4~・五輪レガシーの取組については、一般事業へ移行し、継続】											
事業規模		全体	復興ありがとうホストタウン事業 東京2020大会気運醸成事業 聖火リレー関連事業	うち着手済	東京2020大会が1年延期となったことに伴い、当市における事業の終期も令和3年度に延びた。	完了年度	R3予定						
事業費(千円)		計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	R2	備考
		16,218	0	0	0	0	0	0	0	295	5,179	10,744	R3予算額 4,332

