

岩 沼 市 震 災 復 興 計 画
マスタープラン（改定版）評価結果

平成27年11月

岩 沼 市

1. 震災復興計画マスタープラン(改定版)評価の趣旨

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北地方太平洋沖地震は、我が国観測史上最大規模の地震であり、岩沼市においても過去に例を見ない極めて甚大な被害が生じました。

岩沼市では、この震災からの復興を図るため、平成 23 年 9 月に策定し、平成 25 年 9 月に改定を加えた『岩沼市震災復興計画マスタープラン(改定版)』(以下「マスタープラン」という。)に基づき、被災者の一日も早い生活の再建と産業の再生などを目指して、復旧・復興に取り組んできました。

本評価は、来年 3 月に震災から 5 年を迎えるにあたって、これまで取り組んできた復旧・復興事業の進捗状況等、さらには取り組むべき方向性を明確にし、発展期にかけたこれからの展開について明確にするために行ったものです。

2. 評価結果と今後の対応

マスタープランに掲げる各事業の評価を行った結果、9 割以上の事業は完了の目途がついており、全体としては順調でありました。しかしながら、各事業の進捗状況平均は、未だ 7 割を下回っていることから、平成 29 年度までの発展期において、1 日も早い完了に向けた事業継続が必要であります。

今後は、着実な事業の進捗に努めるとともに、完了まで長期間を要するものについては、いわぬま未来構想に基づく実施計画に位置づけ、事業を推進してまいります。また、状況の変化等を考慮した事業の精査などを必要に応じて行うことにより、復興計画の達成を目指してまいります。

震災復興計画に係る復興事業評価一覧

(平成27年9月末現在)

重点 取組事項	事業 番号	事業名	計画 進捗	事業進捗			完了予定
				(全体)	(うち実施済)	(事業進捗割合)	
被災者の 生活支援 と住環境 の整備	1	サポートセン ター運営事業	A	サポートセンターの運営	応急仮設住宅実質入居戸数34戸	100%	29年度まで 継続実施
	2	各種被災者 支援事業	B	各種制度の受付業務等	援護支援貸付:137件 基礎支援金:1,375件 加算支援金:964件 住宅再建等支援金:1,140件	80%	30年度
	3	集団移転・ 復興住宅事業 (うち集団移転 分)	A	集団移転関において宅地158区画、 公園4箇所、集会所3棟、生活利便施 設区画の整備を行うとともに、現地再 建の世帯に移転の働きかけを行う。	宅地の区画整備(内、146区画契 約)、公園整備、集会所建設、生活利 便施設区画整備完了 ※参考 現地再建世帯16	95%	27年度
		集団移転・ 復興住宅事業 (うち復興住宅 事業分)	A	防災集団移転地の玉浦西地区へ178 戸(集会所1棟を含む)、隣接する三 軒茶屋西土地区画整理事業地内へ 32戸の計210戸の災害公営住宅を整 備する。	210戸全て整備完了。	100%	完了
	4	ライフライン 対策(耐震)事 業	A	19.5ha(4,693m) 施設計画策定・実施設計・土質調査・ 積算管理業務一式 下水道施設整備工事 L=4,693m	19.5ha(4,693m) 施設計画策定・実施設計・土質調査・ 積算管理業務一式 下水道施設整備工事 L=4,693m	100%	完了
	5	自然エネル ギー活用モデ ル事業	B	玉浦西防災集団移転、 災害公営住宅(計368戸)	災害公営住宅全戸にソーラーパネル 設置 太陽光発電施設設置補助を実施	20%	29年度
減災を基 本とした 安全・安 心なまち づくり	1	防潮堤 整備事業	A	L=29km T.P+7.2m	L=28km 着手済み(うち 約26km完 成)	98%	27年度
	2	貞山堀 整備事業	A	L=12,440m T.P+3.5m	L=8,750m 着手済み	70%	29年度
	3	市道沿線 盛土等事業	A	L=7,235m W=11.5m 橋梁2か所	L=7,235m W=11.5m 橋梁2か所 着手済み	71.6%	28年度
	4	避難路 確保事業	A	L=5,491m W=11.5m 橋梁1か所	L=5,491m W=11.5m 橋梁1か所 着手済み	87.9%	27年度
	5	排水対策事業	B	排水路整備(二野倉、二野倉2号、矢 野目)L=5,950m 排水機場新設整備 3箇所	排水路整備L=5,950m 排水機場新設整備 整備中	41%	30年度
	6	「千年希望の 丘」整備事業	B	避難丘15基の整備	相野釜3基、二野倉2基、海浜緑地南 ブロック1基 計6基整備済み	50%	29年度
	7	公共施設 再構築事業	B	東保育所再建(定員90名、870㎡)、 東児童館再建(446㎡) (仮)防災コミュニティセンター建設	東児童館再建(事業年度:H25～ H26、H26.6開館)	30%	30年度
	8	防災意識 啓発事業	B	地域防災計画の策定を踏まえ、市民 への周知と、自助、共助の意識啓発 の方策を講じる。	津波避難のあり方懇談会を通して、 安全な避難のルール作りの方向付け を行う。 津波避難訓練を実施。自主防災組織 への災害備品の助成。	50%	29年度
	9	防災教育事業 (学校)	A	市内小・中学校8校	市内小・中学校8校	100%	29年度まで 継続実施

進捗状況凡例 A:完了、又は平成29年度までの完了が確定(未来構想による事業変更を含む) B:継続的に事業を行い、事業完了予定時期が平成30年度以降になるた
め、未来構想へ事業継承済 C:事業の構想策定が完了し、一部事業に着手 D:事業の構想策定中 E:未着手


震災復興計画に係る復興事業評価一覧

(平成27年9月末現在)


重点 取組事項	事業 番号	事業名	計画 進捗	事業進捗			完了予定
				(全体)	(うち実施済)	(事業進捗割合)	
3 産業の復興と新産業の創出	1	農地復旧事業 (がれき処理、除塩、排水対策)	A がれき・農地・施設復旧 除塩対策 排水対策(排水路、排水機場) 農地復旧(相野釜、長谷釜)	がれき・農地・施設復旧 除塩対策(県) 農地復旧(相野釜)	100%(がれき・農地・施設復旧) 100%(除塩対策) 50%(排水対策 農地復旧)	29年度	
	2	農家支援事業 (復興組合支援、試験栽培支援)	A 復興組合支援(がれき除去) 栽培試験等(園芸作物、先端技術)	復興組合支援 試験栽培等(企業と連携した栽培、先端技術導入試験)	100%(復興組合支援) 50%(試験栽培等)	27年度	
	3	農業生産 低コスト化事業	A ほ場整備事業 集落営農法人化支援	ほ場整備事業 集落営農法人化支援	90%(ほ場整備事業) 90%(集落営農法人化支援)	28年度	
	4	農業生産 付加価値化事業	B 施設園芸の再生 高付加価値化(ブランド化、新作物導入、6次産業化)	実施可能法人において復興交付金により、施設整備、栽培開始。	100%	29年度まで 継続実施	
	5	農業経営 多角化事業	B 有利な転作物導入 効率化技術の導入 取引先の多様化	有利な転作物導入制度検討実施 効率化技術の導入試験中 取引先の多様化	90%(転作物導入) 20%(効率化技術導入) 20%(取引先多様化)	29年度	
	6	雇用対策事業	A 計画数(年度途中の更新を含む延べ人数) 23年度:68人、24年度:47人、25年度:32人、26年度:28人、27年度:24人 計:199人	計画数(年度途中の更新を含む延べ人数) 23年度:61人、24年度:49人、25年度:31人、26年度:28人、27年度:24人 計:193人	96.9%	28年度まで 継続実施	
	7	工業団地 支援事業	B 中小企業等グループ施設等復旧整備補助(国・県補助)	H23:23社、H24:35社、H25:7社、H26:70社	100%	完了	
	8	企業誘致事業	B 企業立地奨励金交付件数計画数 10件	実績数 H23:2件、H24:2件、H25:3件、H26:0件、H27:0件	70%	30年度	
	9	健康医療産業 集積推進事業	C 構想面積約85ha	地権者会設立に向けた検討開始	5%	29年度	
	10	自然エネルギー 誘致(設置)事業	A 対象地区:相野釜西地区(43.6ha)	整備面積43.6ha 平成27年4月10日より発電開始	100%	完了	
4 震災の伝承と歴史的景観の保全	1	震災伝承事業	D 地震・津波防災ミュージアムの整備等	地震・津波防災ミュージアムの誘致について、国・県に働きかけを行う。 絵本「きぼうのおか」の発行・配布	10%	29年度	
	2	文化的景観 保全事業	B 優れた農村集落景観を保全するために貞山運河再生などの事業を行う(延長:13.5km、TP:+3.7m) 防風林の再生	県により「貞山運河再生・復興ビジョン」を策定	20%	29年度	
B以上の割合			92.6%	事業進捗割合平均	69.8%		

進捗状況凡例 A:完了、又は平成29年度までの完了が確定(未来構想による事業変更を含む) B:継続的に事業を行い、事業完了予定時期が平成30年度以降になるため、未来構想へ事業継承済 C:事業の構想策定が完了し、一部事業に着手 D:事業の構想策定中 E:未着手


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
1-1 サポートセンター運営事業		H23~H29	市	A					
事業概要	里の杜サポートセンターによる日常生活に包括的サポートを継続して運営します。また、集団移転先においても引き続き心のケア対策に取り組みます。								
事業規模	全体	サポートセンターの運営	うち実施済 応急仮設住宅実質入居戸数34戸	進捗割合 100%					
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	123,330	2,430	1,290	12,690	19,790	20,450	33,340	33,340	0

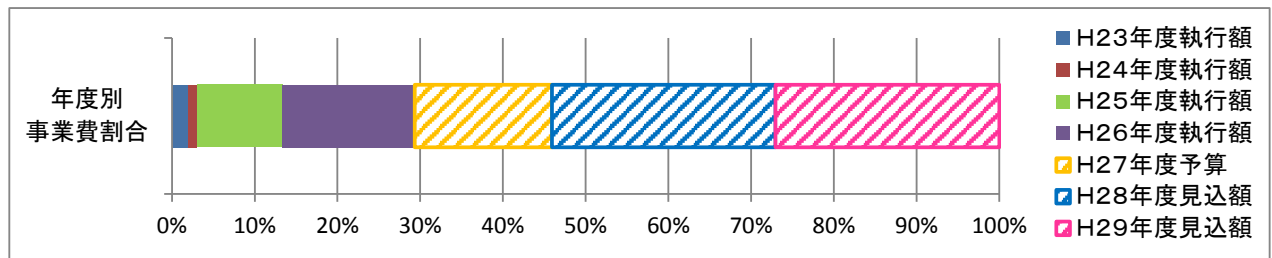


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
1-2 各種被災者支援事業		H23~H30	国・県・市	B					
事業概要	被災者生活再建支援法に基づく生活再建支援金の支給など、被災された方々の生活再建や生活相談など、市独自の制度も含め各種支援を行います。								
事業規模	全体	各種支援制度の受付業務等	うち実施済 援護支援貸付:137件 基礎支援金:1,375件 加算支援金:964件 住宅再建等支援金:1,140件	進捗割合 80%					
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	2,587,280	2,600	126,870	407,070	525,060	993,680	176,000	176,000	180,000

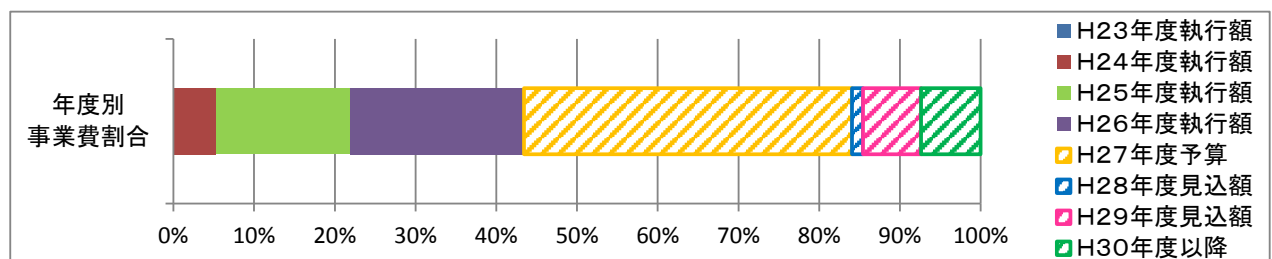


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
1-3 集団移転・復興住宅事業(うち集団移転分)		H23~H27	市	A					
事業概要	地区の意向を踏まえつつ、津波被害を受けた沿岸集落地区の集団移転先住宅団地の整備を進めます。また、併せて災害公営住宅の整備を進めます。								
事業規模	全体	集団移転先において宅地158区画、公園4箇所、集会所3棟、生活利便施設区画の整備を行うとともに、現地再建の世帯に移転の働きかけを行う。	うち実施済 宅地の区画整備(内、146区画契約)、公園整備、集会所建設、生活利便施設区画整備完了 ※参考 現地再建世帯16	進捗割合 95%					
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	14,342,891	0	6,551,764	5,005,020	1,501,668	1,284,439	0	0	0

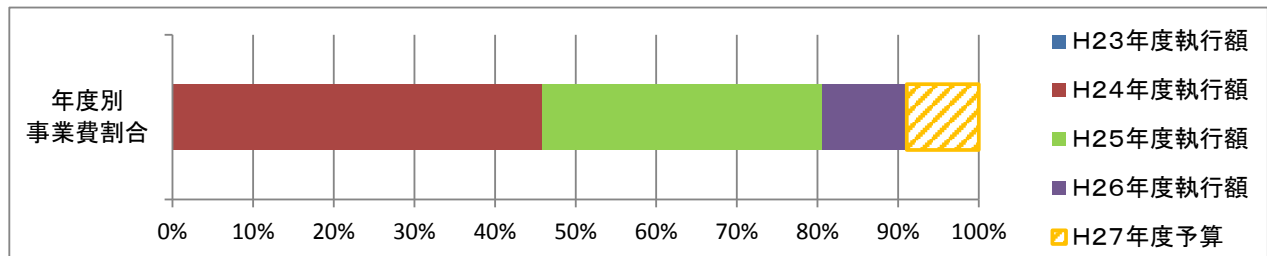


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
1-3 集団移転・復興住宅事業(うち復興住宅事業分)		H23~H26	市	A					
事業概要	地区の意向を踏まえつつ、津波被害を受けた沿岸集落地区の集団移転先住宅団地の整備を進めます。また、併せて災害公営住宅の整備を進めます。								
事業規模	全体	防災集団移転地の玉浦西地区へ178戸(集会所1棟を含む)、隣接する三軒茶屋西土地区画整理事業地内へ32戸の計210戸の災害公営住宅を整備する。	うち実施済 210戸全て整備完了。	進捗割合 100%					
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	5,122,300	0	907,480	234,400	3,980,420	0	0	0	0

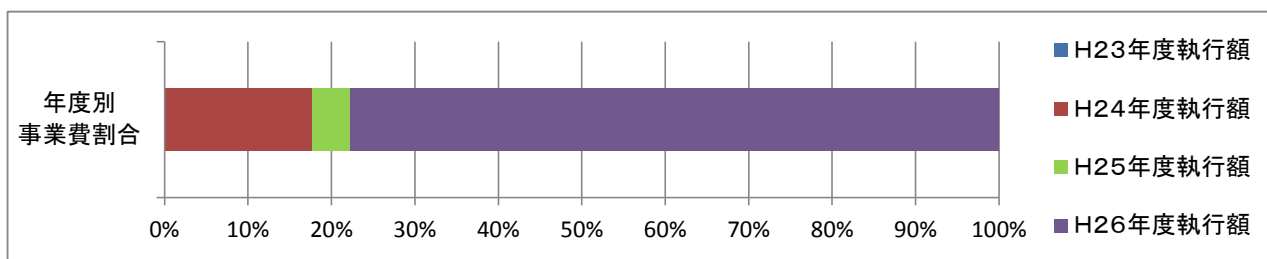


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
1-4 ライフライン対策(耐震)事業		H23~H25		市		A			
事業概要	今回の震災被害により甚大な被害が生じた上下水道、下水道等について、施設の復旧を進めます。また、併せて耐震化対策等を行います。								
事業規模	全体	19.5ha(4,693m) 施設計画策定・実施設計・土質調査・ 積算管理業務 一式 下水道施設整備工事 L=4,693m	うち 実施済	19.5ha(4,693m) 施設計画策定・実施設計・土質調査・ 積算管理業務 一式 下水道施設整備工事 L=4,693m	進捗割合	100%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	253,900	0	0	253,900	0	0	0	0	0

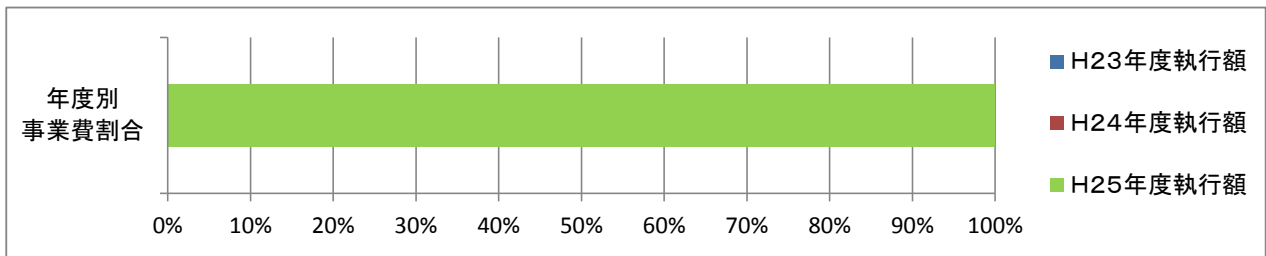


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
1-5 自然エネルギー活動モデル事業		H23~H29		市		B			
事業概要	自然エネルギーを活用したまちづくりをモデル的に実施します。								
事業規模	全体	玉浦西防災集団移転、災害公営住宅 (計368戸)	うち 実施済	・災害公営住宅全戸にソーラーパネル設置(宮城県) ・太陽光発電施設設置補助を実施	進捗割合	20%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	20,236	0	0	0	9,036	11,200	0	0	0

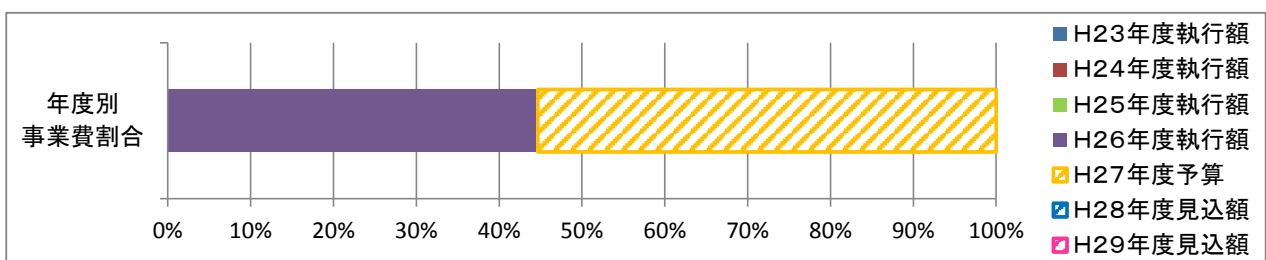


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
2-1 防潮堤整備事業		H23~H27		国		A			
事業概要	被災した海岸保全施設等の機能強化を図るため、粘り強い堤防構造による施設復旧、海岸防災林の再生を行います。								
事業規模	全 体	L=29km T.P+7.2m	う ち 実 施 済	L=28km着手済み (うち約26km完成)			進 捗 割 合	98%	
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-




事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
2-2 貞山堀整備事業		H25~H29		県		A			
事業概要	まちづくりと連携し、防災機能の強化を含めた貞山堀の総合的な浸水対策として護岸の改修を図ります。								
事業規模	全 体	L=12,440km T.P+3.5m	う ち 実 施 済	L=8,750km 着手済み			進 捗 割 合	70%	
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-




事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
2-3 市道沿線盛土等事業		H24~H28		市		A			
事業概要	多重防御のまちづくりを推進するため、市道相野釜線蒲崎線の嵩上げ道路整備を図ります。								
事業規模	全 体	L=7,235m W=11.5m 橋梁2か所	う ち 実 施 済	L=7,235m W=11.5m 橋梁2か所 着手済み	進 捗 割 合	71.6%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	10,715,958	0	48,800	609,210	2,747,970	7,057,478	252,500	0	0

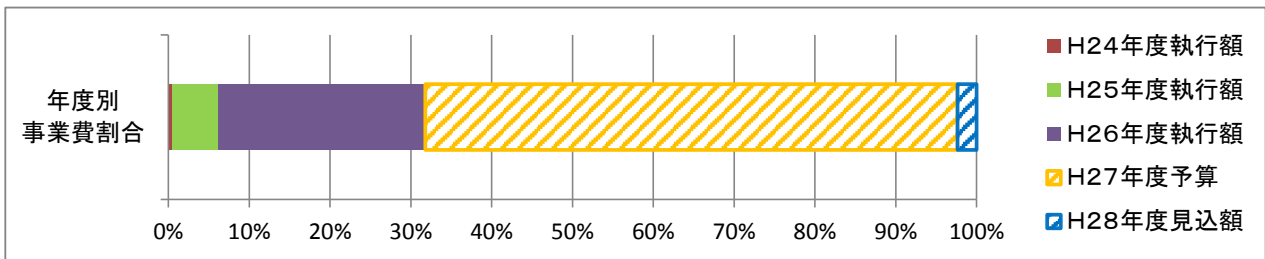


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
2-4 避難路確保事業		H23~H27		県・市		A			
事業概要	東部地区の避難路を確保するため、県道岩沼海浜緑地線、主要地方道仙台空港線、主要地方道塩釜巨理の拡幅整備等を県と連携して取り組みます。 また、津波避難のあり方懇談会や避難訓練などの敬意を踏まえ、東西地方の市道等を津波避難経路として位置付け、整備を図ります。								
事業規模	全 体	L=5,491m W=11.5m 橋梁1か所	う ち 実 施 済	L=5,491m W=11.5m 橋梁1か所 着手済み	進 捗 割 合	87.9%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	3,301,562	0	27,000	140,240	658,770	2,475,552	0	0	0

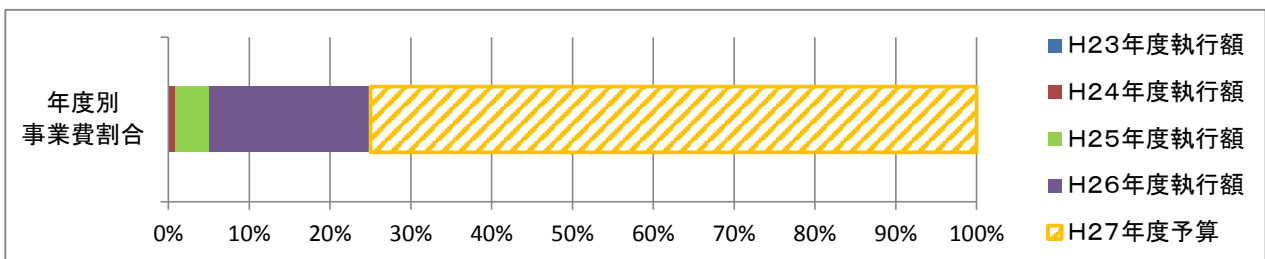


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
2-5 排水対策事業		H24~H30	国・県・市	B					
事業概要	地盤沈下や排水機場の機能喪失等に伴う浸水リスクの増大に対し、流域一体となった総合的な浸水対策を関係機関とともに進めます。特に、赤井江から太平洋への直接放流、排水機場の増設、阿武隈川堤防の質的整備、五間堀川の拡幅整備など市域全体の排水対策を国・県等関係機関と連携して取り組みます。								
事業規模	全 体	排水路整備(二野倉、二野倉2号、矢野目) L=5,950m 排水機場 3箇所	うち 実施済	排水路整備 5,950m 排水機場 整備中	進捗割合 41%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	23,230,410	0	185,560	3,063,310	7,159,970	12,636,670	184,900	0	0

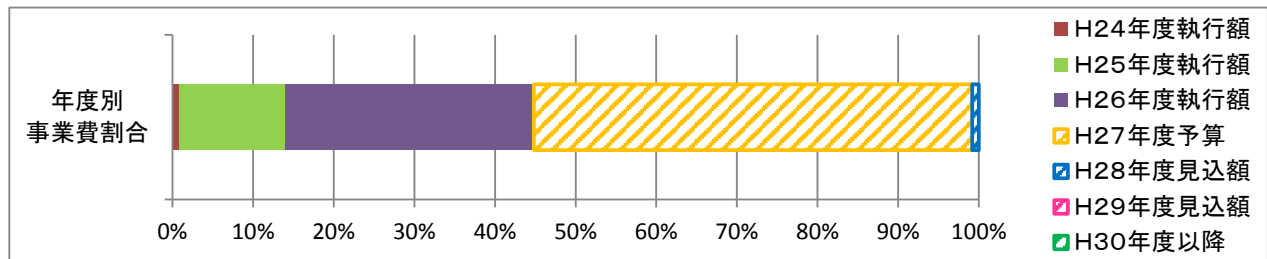


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
2-6 「千年希望の丘」整備事業		H23~H29	市	B					
事業概要	「千年希望の丘」の全体計画の実現に向けて取り組みます。また、「千年希望の丘」を含めたエリアをメモリアルパークとして整備を進めます。								
事業規模	全 体	避難丘15基の整備	うち 実施済	相野釜3基、二野倉2基、海浜緑地南ブロック1基 計6基整備済み	進捗割合 50%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	3,415,620	0	182,050	443,000	1,390,570	1,400,000	0	0	0

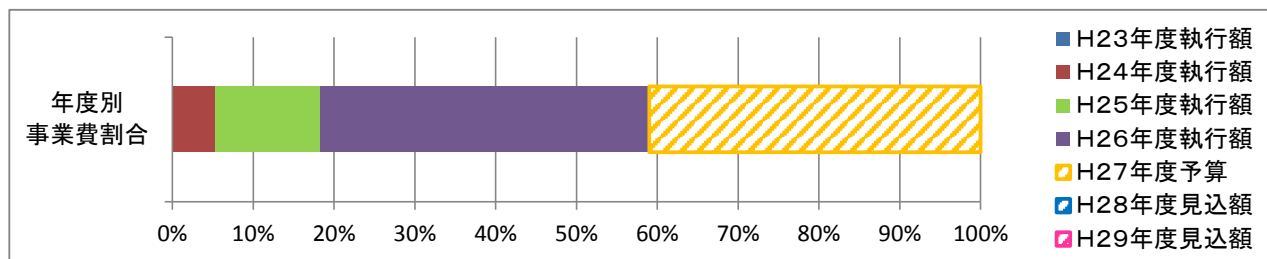


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
2-7 公共施設再構築事業		H24~H30	県・市	B					
事業概要	浸水被害を受けた東保育所、東児童館等について、施設の再構築を図ります。								
事業規模	全 体	東保育所再建(定員90名、870㎡)、 東児童館再建(446㎡) (仮)防災コミュニティセンター建設	う ち 実 施 済	東児童館再建(事業年度:H25~ H26、H26.6開館)	進 捗 割 合 30%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	420,470	0	25,790	307,640	46,640	20,400	20,000	0	0

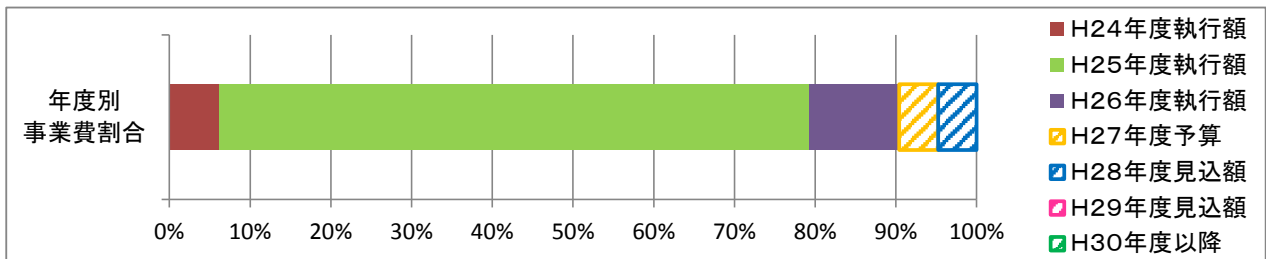


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
2-8 防災意識啓発事業		H23~H29	市	B					
事業概要	市民一人ひとりが災害に的確に対応できるよう、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、津波情報提供設備や避難誘導標識等の設置を図り、津波を想定した避難訓練の充実に取り組みます。								
事業規模	全 体	地域防災計画の策定を踏まえ、市民 への周知と自助、共助の意識啓発の 方策を講じる。	う ち 実 施 済	津波避難のあり方検討会を通して、 安全な避難のルール作りの方向付け を行う。 津波避難訓練を実施。自主防災組織 への災害備品の助成。	進 捗 割 合 50%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	57,330	0	0	0	9,720	20,050	13,780	13,780	0

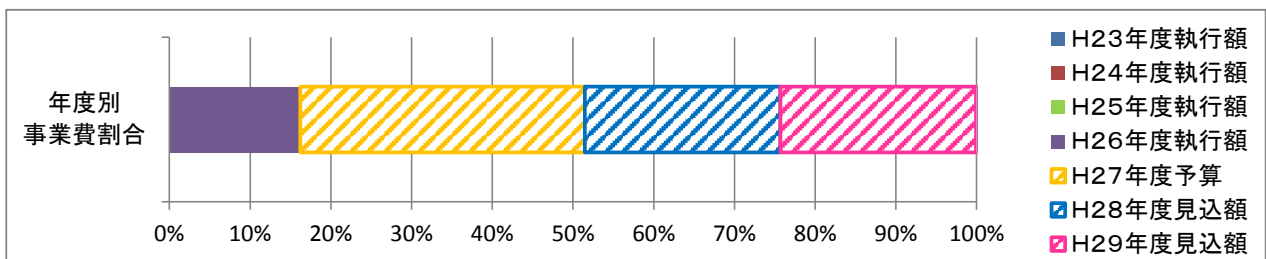


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
2-9 防災教育事業(学校)		H23~H29		市		A			
事業概要	「学校の危機管理」を策定するとともに、各小中学校において防災マニュアルを作成し、実践・検討を行います。								
事業規模	全 体	市内小・中8校	う ち 実 施 済	市内小・中8校	進 捗 割 合	100%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	1,580	0	1,490	90	0	0	0	0	0

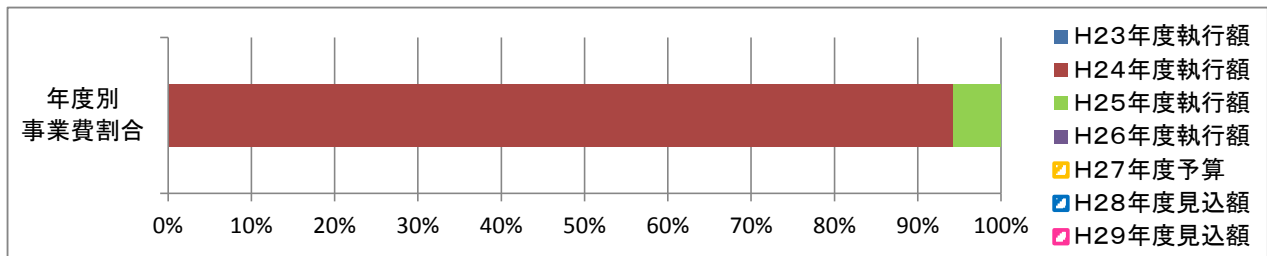


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
3-1 農地復旧事業(がれき処理、除塩、排水対策)		H23~H29		国・県・市		A			
事業概要	震災により著しく損なわれた農業生産力の回復・機能向上を図るため、がれき処理、除塩対策、排水対策を関係機関と連携して取り組みます。								
事業規模	全 体	がれき・農地・施設復旧 除塩対策 排水対策(排水路、排水機場) 農地復旧(相野釜、長谷釜)	う ち 実 施 済	がれき・農地・施設復旧 除塩対策(県) 農地復旧(相野釜)	進 捗 割 合	100%(がれき・農地・施設復旧) 100%(除塩対策) 50%(排水対策・農地復旧)			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	70,160	48,770	7,280	6,130	7,980	0	0	0	0

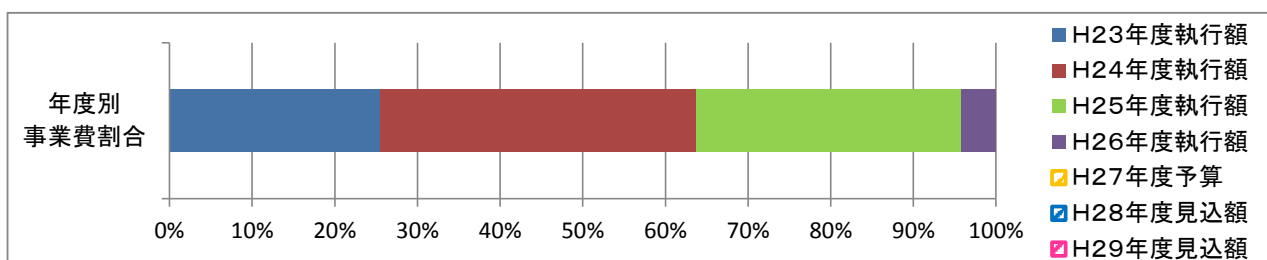


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-2 農地支援事業(復興組合支援、試験栽培支援)		H23~H27	県・市	A					
事業概要	被災農家の早期の経営再開を目指し、復興組合等の運営を支援するとともに、農地復旧の共同作業に対し支援金を交付します。 また、被災農地の再生のために行う試験栽培等に関して、必要な支援を行います。								
事業規模	全体	復興組合支援(がれき除去) 試験栽培等(園芸作物、先端技術)	うち実施済	復興組合支援 試験栽培等(企業と連携した栽培、先端技術導入試験)	進捗割合 100%(復興組合支援) 50%(試験栽培等)				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	542,050	296,570	160,580	84,900	0	0	0	0	0

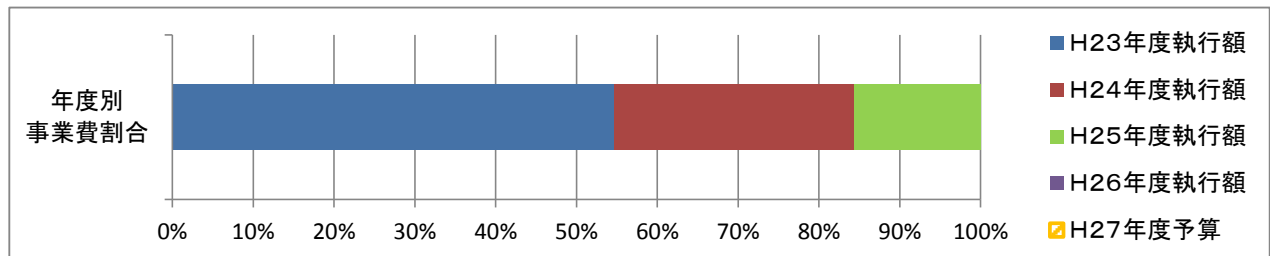


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-3 農業生産低コスト化事業		H23~H28	県・市	A					
事業概要	効率的で低コストな農業経営を実現するため、農地の面的集約や経営の大規模化、ほ場の大区画化、集落営農等の取組みを進めます。								
事業規模	全体	ほ場整備事業 集落営農法人化支援	うち実施済	ほ場整備事業 集落営農法人化支援	進捗割合 90%(ほ場整備事業) 90%(集落営農法人化支援)				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	3,724,020	140,210	165,960	2,021,900	1,204,820	191,130	0	0	0

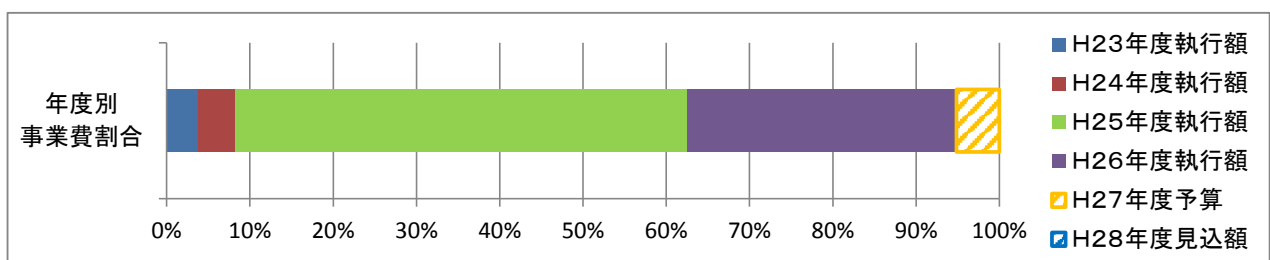


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-4 農業生産付加価値化事業		H23~H29	市	B					
事業概要	収益性の高い農業経営を実現するため、施設園芸の再生、ブランド化、新作物導入、6次産業化など、高付加価値化の取組みを進めます。								
事業規模	全体	施設園芸の再生 高付加価値化(ブランド化・新作物導入・6次産業化)	うち実施済	実施可能法人において復興交付金により、施設整備、栽培開始。	進捗割合 100%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	467,130	0	0	6,910	460,220	0	0	0	0

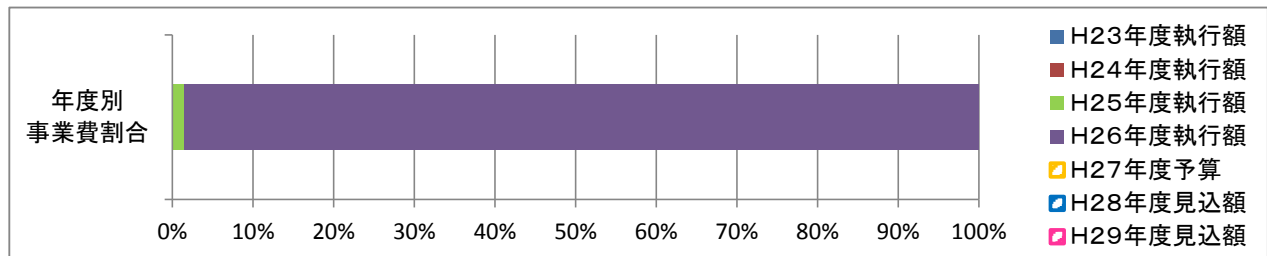


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-5 農業経営多角化事業		H23~H29	市	B					
事業概要	農業・農村の活性化を図るため、地域資源を活用して、食文化の発信、グリーンツーリズム、自然エネルギーの活用などの取組みを進めます。								
事業規模	全体	有利な転作作物導入 効率化技術の導入 取引先の多様化	うち実施済	有利な転作作物導入制度検討実施 効率化技術の導入試験中 取引先の多様化	進捗割合 90%(転作作物導入) 20%(効率化技術導入) 20%(取引先多様化)				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-




事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
3-6 雇用対策事業		H23~H28		国・県・市		A			
事業概要	被災失業者の生活安定を図るため、緊急かつ臨時的な雇用機会の創出を図ります。また、震災により事業活動の縮小を余儀なくされた事業者に対して、雇用の維持のために要した経費等を助成します。								
事業規模	全 体	計画数(年度途中の更新を含む延べ人数) 23年度:68人、24年度:47人、25年度:32人、26年度:28人、27年度:24人 計:199人	うち 実施済	計画数(年度途中の更新を含む延べ人数) 23年度:61人、24年度:49人、25年度:31人、26年度:28人、27年度:24人 計:193人(県より事業は27年度末で終了と通達あり)	進捗 割合	96.9%			
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	159,020	36,160	63,630	20,490	19,040	19,700	0	0	0

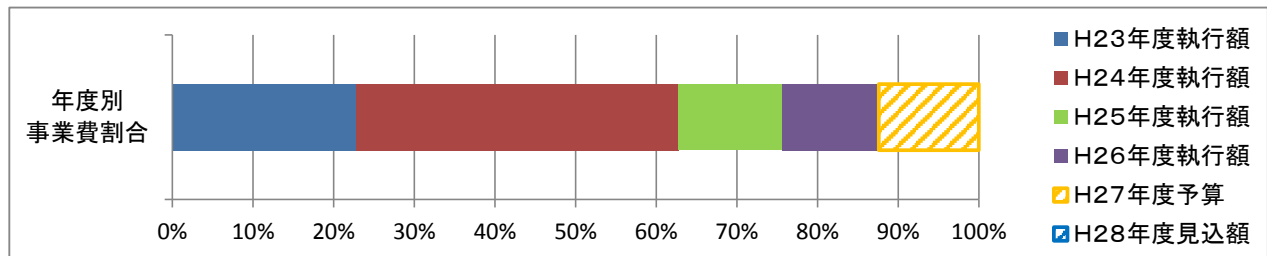


事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
3-7 工業団地支援事業		H23~H27		県・市		B			
事業概要	市民一人ひとりが災害に的確に対応できるよう、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、津波情報提供設備や避難誘導標識等の設置を図り、津波を想定した避難訓練の充実に取り組みます。								
事業規模	全 体	中小企業等グループ施設等復旧整備補助(国・県補助)	うち 実施済	H23:23社、H24:35社、H25:7社、H26:70社			進捗 割合	100%	
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-




事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-8 企業誘致事業		H23~H30	県・市	B					
事業概要	将来における雇用の場を確保するため、既存工業団地を始め、産業基盤の健全性をアピールするとともに、東日本(東北地方)における物流拠点等の整備や新たな産業分野の集積に向けて、企業誘致活動を展開します。								
事業規模	全 体	企業立地奨励金交付件数計画数 10 件	うち 実施済	実績数 H23:2件 H24:2件 H25:3 件 H26:0件 H27:0件	進捗 割合 70%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	256,830	26,230	43,600	0	187,000	0	0	0	0

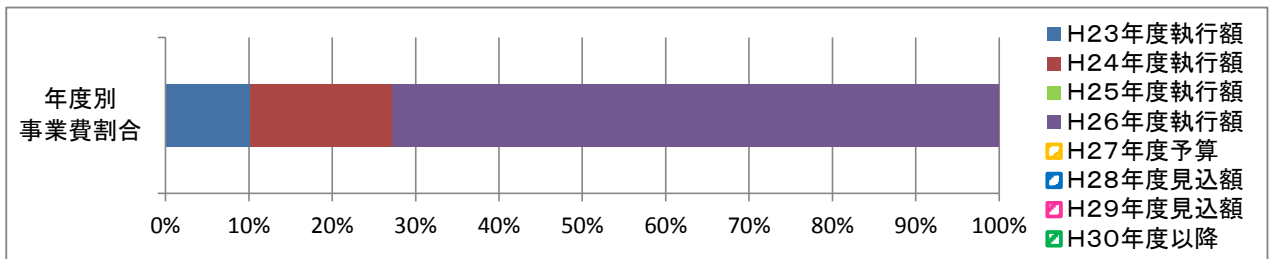


事業名		事業期間	事業主体	進捗状況					
3-9 健康医療産業集積推進事業		H23~H29	市	C					
事業概要	被災地における雇用の確保を図るため、世界を視野に入れた健康医療関連の産業都市整備に向けた事業を関係機関と連携して推進します。								
事業規模	全 体	構想面積約85ha	うち 実施済	地権者会設立に向けた検討開始	進捗 割合 5%				
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	12,128,622	0	63,420	64,720	13,160	10,000	4,425,574	7,551,748	0

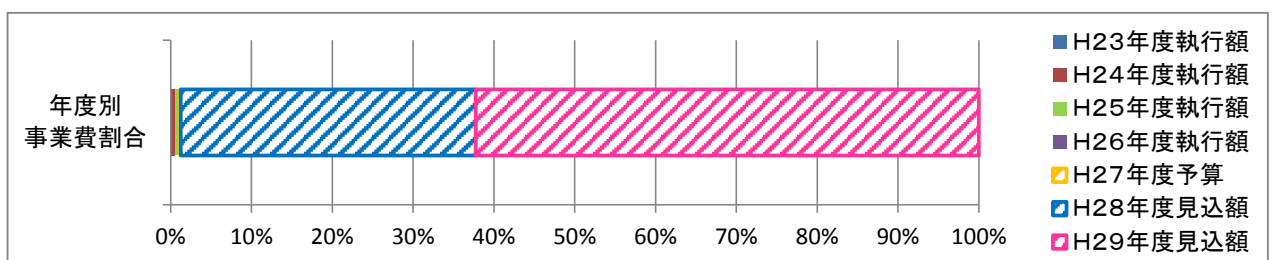

事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
3-10 自然エネルギー誘致(設置)事業		H24~H29		市		A			
事業概要	自然エネルギーの導入を促進するため、太陽光等による大規模発電施設の誘致(設置)を促進します。								
事業規模	全体	対象地区: 相野釜西地区(43.6ha)	うち実施済	整備面積43.6ha 平成27年4月10日より発電開始	進捗割合	100%			
事業費(千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	78,210	0	28,500	45,720	3,990	0	0	0	0

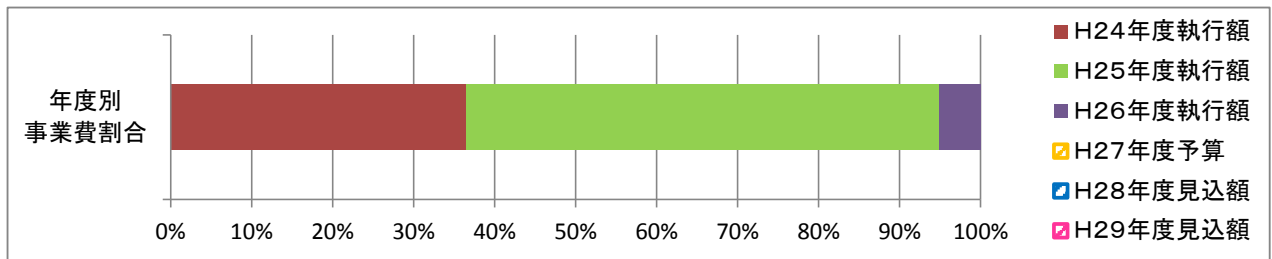

事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
4-1 震災伝承事業		H23~H29		国・県・市		D			
事業概要	メモリアルパーク内に(仮称)地震・津波防災ミュージアムの整備について、関係機関と連携して取り組みます。								
事業規模	全体	地震・津波防災ミュージアムの整備等	うち実施済	地震・津波防災ミュージアムの誘致について、国・県に働きかけを行う。 絵本「きぼうのおか」の発行・配布	進捗割合	10%			
事業費(千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-



事業名		事業期間		事業主体		進捗状況			
4-2 文化的景観保全事業		H23~H29		国・県・市		B			
事業概要	県で策定した「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づき、人と自然と歴史が調和した、人々が集う魅力的な沿岸地域の復興に向けて、貞山堀の文化的、歴史的景観の保全・再生を県に働きかけます。また、防風林の再生に向けて、関係機関と連携して取り組みます。								
事業規模	全 体	優れた農村集落景観を保全するために貞山運河再生などの事業を行う (延長: 13.5km、TP: +3.7m)	う ち 実 施 済	県により「貞山運河再生・復興ビジョン」を策定			進 捗 割 合	20%	
事業費 (千円)	総事業費	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30以降
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

